

การลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และติดตามต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน และอำเภอควนกาหลง

**โครงการที่ ๑** โครงการป้ายแนะนำเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงสตูล เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ๓ กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมที่ ๑ ติดตั้งป้าย overhead คร่อมถนน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ กม.๖๕+๘๑๐ และ กม.๖๕+๐๕๐ แยกทุ่งตำเสา ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
- กิจกรรมที่ ๒ ติดตั้งป้าย overhang บริเวณทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ กม.๘๒+๘๕๐ (ซ้ายทาง) ต.บ้านควน อ.เมือง และทางหลวงหมายเลข ๔๒๑ กม.๑๐+๑๕๐ (ขวาทาง) ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
- กิจกรรมที่ ๓ ติดตั้งป้ายบอกทางสู่แหล่งท่องเที่ยว UNESCO GLOBAL GEOPARK Land บริเวณทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ กม.๕๕+๘๐๐ - กม.๙๘+๘๐๐ อ.เมืองสตูล อ.ควนโดน และ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ป้าย OVERHEAD คร่อมถนน



จุดติดตั้ง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ (แยกทุ่งตำเสา) ที่ กม.๖๕+๐๕๐ ด้านซ้ายทาง



ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว



ป้าย OVERHANG



### ผลการก่อสร้าง

- สัญญาเริ่ม ๑๐ มีนาคม - สิ้นสุดสัญญา ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๑๐ วัน
- ประกอบด้วย ติดตั้งป้าย overhead คร่อมถนน จำนวน ๖ จุด ติดตั้งป้าย overhang จำนวน ๑๐ จุด และติดตั้งป้ายแนะนำบอกทางสู่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๑๙๕ จุด
- ขณะนี้ ดำเนินการจะครบถ้วน ๑๐๐ % ยังคงเหลืออีก ๑ ป้ายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ในพื้นที่ อ.ละงู เนื่องจากต้องให้การไฟฟ้าเข้าตัดระบบไฟฟ้าก่อนจึงจะติดตั้งป้ายได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และจะส่งมอบงานต่อไป
- จากการลงพื้นที่ก่อสร้าง ๒ - ๓ จุด ที่ดำเนินโครงการฯ ไม่พบสิ่งผิดปกติ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

### ข้อเสนอแนะ

- งบประมาณดำเนินโครงการฯ ค่อนข้างสูง เกือบ ๓๐ ล้านบาท
- ข้อความบนแผ่นป้ายหลาย ๆ ป้าย โดยเฉพาะป้าย Overhead ไม่สื่อถึงการท่องเที่ยวที่ชัดเจน

**โครงการที่ ๒** โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล งบประมาณ ๒๙,๗๘๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ (ติดตามต่อเนื่อง) ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล



## ผลการก่อสร้าง

การดำเนินงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เนื่องจากไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน มีความล่าช้ามาก และเมื่อมีการขยายเวลาให้อีก ๖ เดือน นับแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งขณะที่ ก.ธ.จ. ลงพื้นที่สอดส่อง ซึ่งสิ้นสุดสัญญาจ้าง ตามที่ได้ขอขยายเวลาแล้ว ปรากฏว่าดำเนินการได้เพียง ๗๓% ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ยังคงเหลือ งานก่อสร้างปูพื้น และตกแต่งภายใน โดยช่างควบคุมงานของ อบจ.สตูล ได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจากวัสดุบางรายการ ประเภทลามิเนตที่กำหนดไว้ตามแบบ ในปัจจุบันไม่มีการผลิตแล้ว จึงจำเป็นต้องหาวัสดุประเภทที่ใกล้เคียงกันมาทดแทน ประกอบกับงานส่วนที่เหลือ เป็นงานตกแต่ง ต้องใช้ความละเอียด ประณีต และต้องใช้เวลานาน คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงานอีกประมาณ ๖ - ๘ เดือน ถึงจะแล้วเสร็จ และขณะนี้คณะกรรมการควบคุมงาน ของ อบจ.สตูล ได้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ ซึ่ง อบจ.สตูลจำเป็นต้องต่อสัญญาให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ พร้อมทั้งให้ปรับปรุง ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด แต่กร้าวให้เรียบร้อยตามที่ได้มีข้อเสนอแนะไว้ ก่อนส่งมอบงานและตรวจรับงานต่อไป

### ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเรียกผู้รับจ้างเข้ามาเจรจาพูดคุยสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคและความล่าช้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้เสนอแนวทางในการเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ หาก อบจ.สต. จะขยายเวลาหรือต่อสัญญาจ้าง หรือปรับแผนการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่ง จะต้องชี้เหตุผลความจำเป็นที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับได้


๒. ขอให้กำกับผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมและเก็บรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ที่ไม่เรียบร้อย ให้เป็นที่เรียบร้อย สภาพดีพร้อมใช้งานจริงก่อนรับมอบงาน

๓. ควรมีการบริหารจัดการและดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายทัศนวิสัยบริเวณโดยรอบของศูนย์บริการ การท่องเที่ยว เพื่อให้มีความสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยว เมื่อโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔. ควรมีการพัฒนาเพื่อต่อยอดจากโครงการเดิมให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

### โครงการที่ ๓

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ ๕ โดยก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตรยาว ๑,๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ อาคารศาลาที่พักประชาชน จำนวน ๒ หลัง ตั้บลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล งบประมาณ ๙,๖๗๖,๒๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหาร ส่วนตำบลควนสตอ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

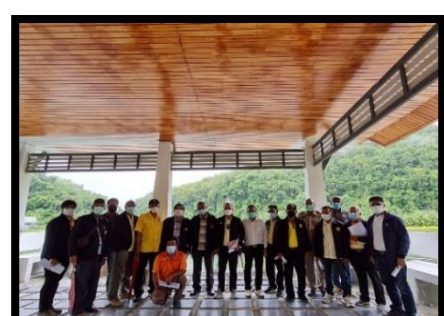

### ผลการสอดส่อง

การดำเนินงานมี ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ การก่อสร้างศาลากลางน้ำและอาคารศาลาที่พักประชาชน/นักท่องเที่ยว และกิจกรรมที่ ๒ การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ซึ่งจากการลงพื้นที่สอดส่อง ก.ธ.จ. สตูล ได้เน้นย้ำให้ อบต.ควนสตอ กำกับ ควบคุม และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาของสัญญาจ้าง เพื่อให้โครงการฯ เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลอีกแห่งหนึ่ง

### ข้อเสนอแนะ

๑. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของโครงการฯ อบต.ควนสตอ ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการไว้ในอนาคต เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนได้เข้ามาใช้บริการ/นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

๒. ขอให้บริหารจัดการและกำกับดูแลในเรื่องภูมิทัศน์และความสะอาดของบริเวณพื้นที่โดยรอบให้สวยงามเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติที่มีอยู่

๓. โครงการควรมีการต่อยอดการดำเนินงานต่อไป เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
